

Drogi Powiatowe 2024 r.



Inwestycje drogowe na drogach powiatowych



Zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych w 2024r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (zł)			
			Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek (dł. odcinka 0,995 km)	735 787,03	209 946,54	89 977,08	435 863,41 RFRD	-
2.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w na odcinku Kowalew - Fabianów (mapy)	14 400,00	14 400,00	-	-	-
3.	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice (dł. odcinka 270 mb)	97 937,44	97 937,44	-	-	-
4.	Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca (mapy)	4 000,00	4 000,00	-	-	-
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie – Janków (mapy)	22 000,00	22 000,00	-	-	-
6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice – Rokutów (mapy)	12 000,00	12 000,00	-	-	-
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina (dokumentacja)	3 600,00	3 600,00	-	-	-
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś – Borchysko (mapy)	14 400,00	14 400,00	-	-	-
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca (dł. odcinka – 0,777 km)	2 118 977,81	562 325,70	297 565,43	1 259 086,68 RFRD	<i>W trakcie realizacji – na 2025r.</i>
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego w m. Pleszew) - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	-	-	-
11.	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P) - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	-	-	-

Zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych w 2024r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (zł)			
			Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	502 925,81	502 925,81	-	-	W trakcie realizacji – na 2025r.
13.	Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice – 0,600 km	159 531,00	111 671,70	47 859,30	-	-
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice (dł. odcinka 4,450 km)	6 879 323,60	1 920 753,36	556 714,51 Pleszew 303 781,57 Czermin	4 098 074,16 RFRD	-
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin (dł. odcinka 1,235 km)	791 297,06	553 907,95	237 389,11	-	-
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy (dł. odcinka 1,451 km)	877 856,05	299 409,35	578 446,70	-	-
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów – Sośnica (dokumentacja)	8 160,00	8 160,00	-	-	-
18.	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie (dł. - 272 mb)	228 587,95	114 293,98	114 293,97	-	-
19.	Modernizacja przepustu pod drogą powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	73 800,00	73 800,00	-	-	-
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika (dł. odcinka 141 mb)	213 862,33	106 931,17	106 931,16	-	-
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika (dokumentacja)	17 760,00	17 760,00	-	-	-
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów	175 000,00	95 000,00	80 000,00	-	-
	Razem:	12 966 206,08	4 760 223,00	2 412 958,83	5 793 024,25	-

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat w 2024r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie (zł)	Podział kosztów (zł)			
			Powiat	Gmina	Polski Ład	Inne
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja (dł. odcinka - 0,990 km)	1 562 835,92	367 500,00	205 335,92	990 000,00	-

Zadanie na lata 2025 – 2026

1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca (dł. odcinka – 5,816 km)	16 888 608,14	W trakcie realizacji			
----	--	---------------	----------------------	--	--	--

Zadania inwestycyjne powierzone Gminom w 2024r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (zł)		
			Powiat	Gmina	Uwagi
1.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P . Etap VIII. (dł. chodnika - 184 mb) <i>– Zadanie realizowane przez <u>Gminę Dobrzyca</u></i>	159 945,56	25 000,00	134 945,56	-
2.	Przebudowa drogi powiatowej 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle <i>– Zadanie realizowane przez <u>Gminę Gołuchów</u></i>	18 450,00	9 225,00	9 225,00	Dokumentacja
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4327P w m. Popówek <i>– Zadanie realizowane przez <u>Gminę Gołuchów</u></i>	29 520,00	19 520,00	10 000,00	Dokumentacja
4.	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej 4346P w m. Wszotów <i>– Zadanie realizowane przez <u>Gminę Gołuchów</u></i>	6 150,00	3 075,00	3 075,00	Dokumentacja
	Razem:	214 065,56	56 820,00	157 245,56	

Zestawienie efektów rzeczowych inwestycji zrealizowanych w 2024r.

Gmina	Długość dróg (mb)	Długość chodników (mb)	Zadania inne
Chocz	-	-	Likwidacja przełomów
Czermin	4112,00	-	-
Dobrzyca	777,00	184,00	-
Gizałki	-	141,00	-
Gołuchów	995,00	-	-
Pleszew	4119,00	542,00	Przepust – 2 sztuki
Razem:	10 003,00	867,00	-

Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin



Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin – 1,235 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca



Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca – 0,777 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika dł. 0,141 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek dł. 0,995 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów



Przebudowa drogi powiatowej nr 4334 P na odcinku Prokopów-Broniszewice dł. 4,45 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4334 P na odcinku Prokopów-Broniszewice dł. 4,45 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4334 P na odcinku Prokopów-Broniszewice dł. 4,45 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy na dł. 1,461 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy na dł. 1,461 km



Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie - dł. 0,272 km



Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice – 0,270 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu



Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu




Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja – dł.0,99 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P
na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja – dł.0,99 km



Modernizacja przepustu pod drogą powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę

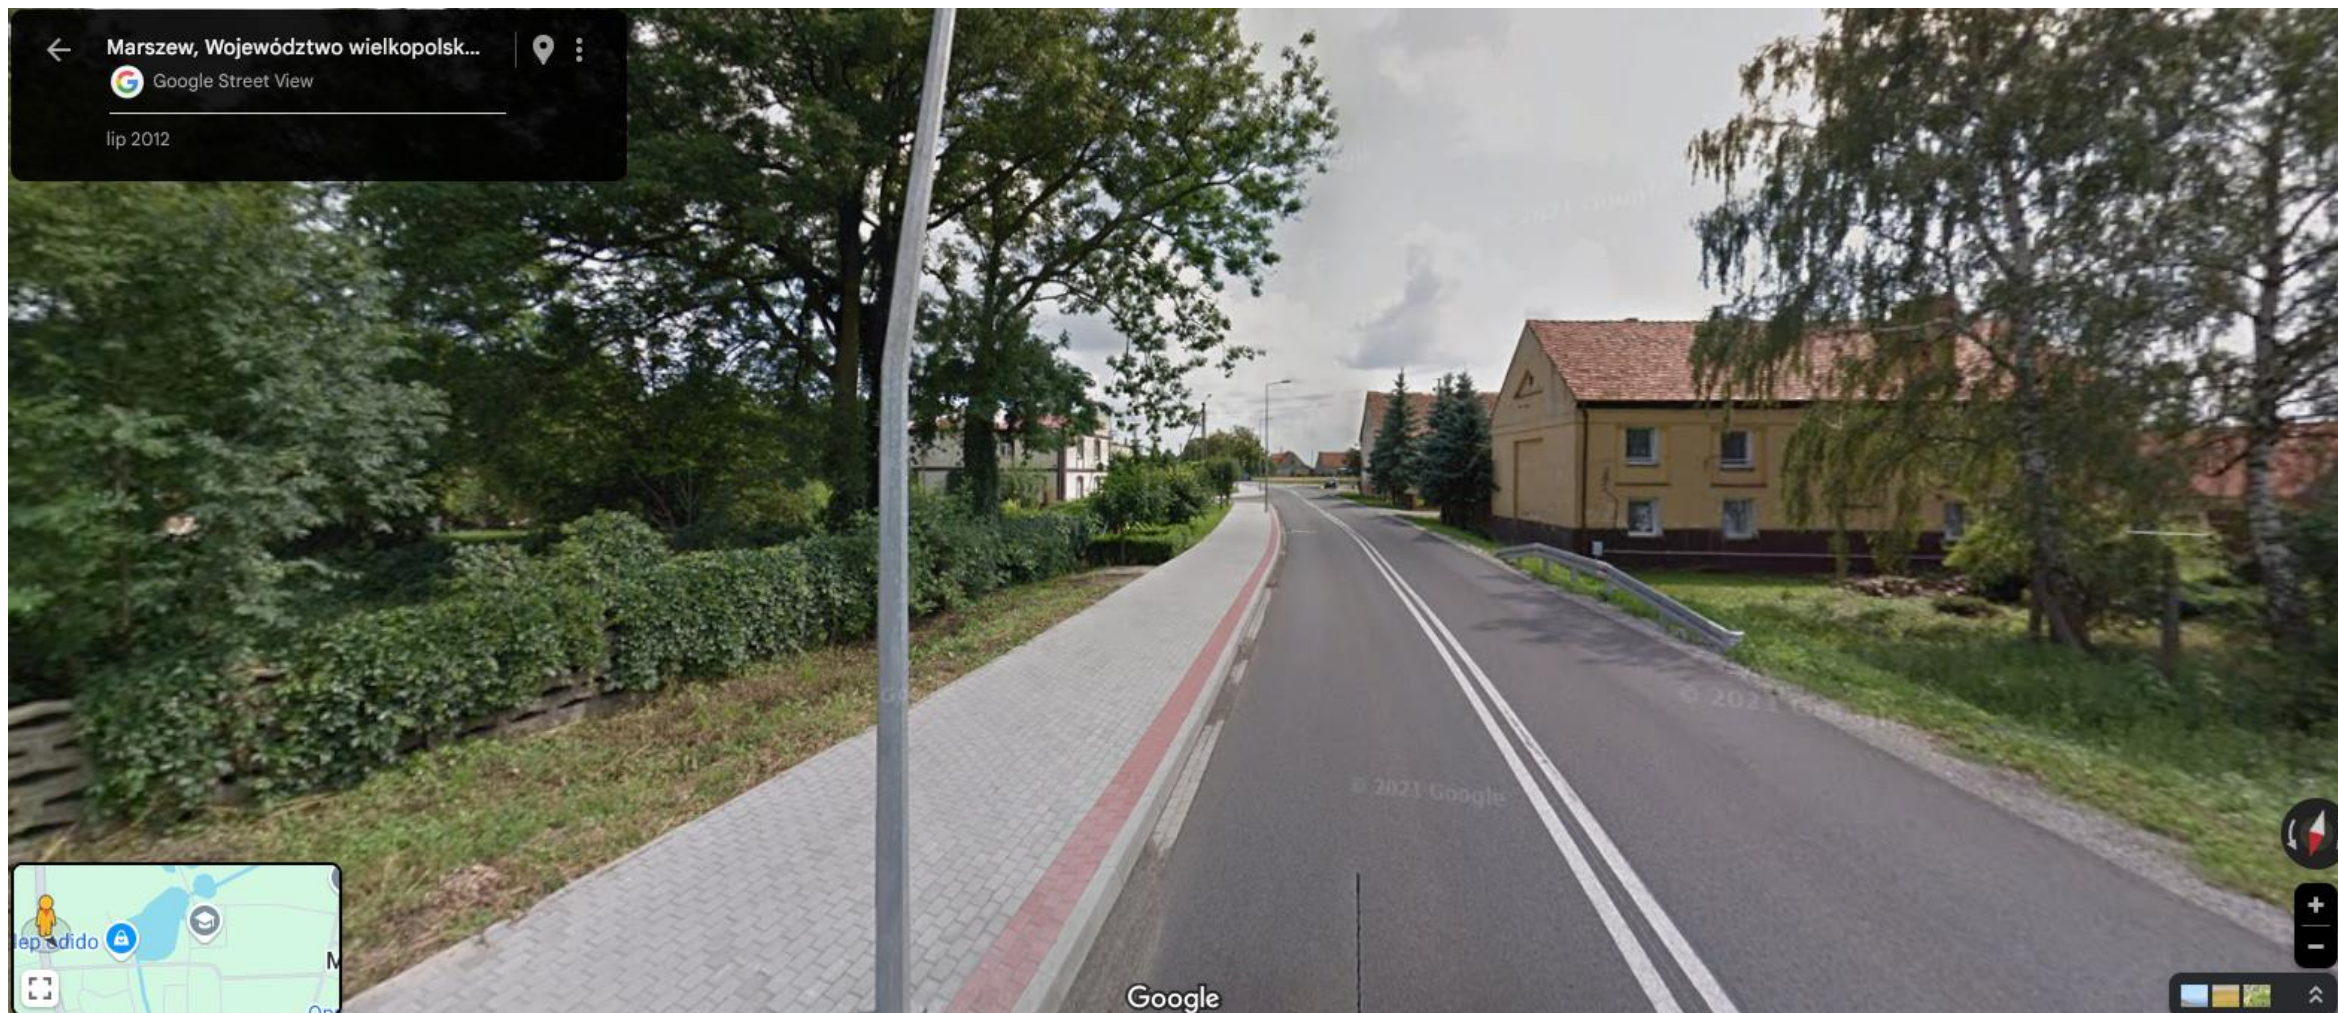

Modernizacja przepustu pod drogą powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę



Modernizacja przepustu pod drogą powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę



Remonty

- bieżące utrzymanie na drogach powiatowych



Główne wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg
w 2024 roku
(prace zlecone podmiotom zewnętrznym, zakupy)



Lp	Wydatek	kwota
1	Remonty cząstkowe nawierzchni masą bitumiczną na gorąco – cała sieć dróg	552 578,00 zł
2	Remonty cząstkowe masą na zimno – zlecone.	35 670,00 zł
3	Zimowe utrzymanie dróg /sezon 2023-2024	480 034,00 zł
4	Opłata za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej /Pleszew/	85 921,00 zł
5	Uzupełnienie i naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego	40 234,00 zł
6	Opróżnianie koszy ulicznych /miasto Pleszew/	28 507,00 zł
7	Remont chodnika wzdłuż dr. powiatowej nr 4173P w m. Strzyżew	52 234 ,00 zł
8	Odtworzenie oznakowania poziomego na ulicach i drogach (w tym przejścia dla pieszych)	123 048,00 zł
9	Zakup nowego oznakowania, luster i barierek wygradzeniowych	31 025,00 zł
10	Utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie poboczy	140 104,00 zł
11	Remont odcinka 100 m.b. dr. powiatowej nr 4337P w m. Grodzisko	50 000,00 zł
12	Likwidacja szkód burzowych	194 603,00 zł
13	Kontrola okresowa dróg i mostów aktualizacja oprogramowania EWIDR 2024, fotorejestracja dróg	26 937,00 zł
14	Wykonanie zjazdów przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4174P w m. Karminek	12 546,00 zł




15	Zakup masy asfaltowej na zimno (32 tony) – dla celów wykonywania remontów nawierzchni przez brygadę ZDP	35 414,00 zł
16	Utwardzenie dojścia do pieszych w m. Czermin (droga nr 4308P)	27 781,00 zł
17	Profilowanie dróg gruntowych wraz z uzupełnieniem kruszywa (dr.Chocz- Białobłoty, Rokutów – Tursko, Karsy-Czechel, Orlina Duża-Orlina Mała, w m. Ludwina, w m. Polskie Oledry, Korzkwy-Skrzypnia	117 720,00 zł
18	Zakup barierek czerwono-białe U-12a	9 225,00 zł
19	Ręczne podsypywanie zaniżonych i oberwanych poboczy wzdłuż dróg 420 ton	59 296,00 zł
20	Odchwaszczanie terenów zielonych ul. Armii Poznań w Pleszewie,, droga 4308P Grab-Czermin	10 569,00 zł
21	Zabiegi pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów (ul. Marszewska w Pleszewie, 4315P w m. Wieczyn)	31 524,00 zł
22	Zamiatanie ulic w Pleszewie, Kowalewie (sprzątanie po zimie)	26 108,00 zł
23	Uprzątnięcie smieci z dróg i odbiór odpadów z dróg	5 000,00 zł
24	Zakup paliwa dla środków transportu i sprzętu	41 974,00 zł
25	Zakup kosiarki bijakowej	47 189,00 zł
26	Zakup głowicy czyszczącej	18 200,00 zł
Razem		2 283 441,00 zł

Środki pozyskane przez ZDP w 2024 roku z tytułu zajęcia pasa drogowego Ogółem - 1 128 307,00zł

Celem ich pozyskania wydano :

- 147 szt. decyzji na zajęcie pasa drogowego na roboty prowadzone przez obce podmioty,
- 7 szt. decyzji na umieszczenie reklam w pasie drogowym,
- 71 szt. decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w drodze,



Pozostałe zadania administracyjne zrealizowane w 2024 roku przez ZDP

- wydano 56 decyzji na lokalizację nowych zjazdów z drogi i przebudowy istniejących
- uzgodniono 111 projektów czasowych i stałych organizacji ruchu,
- wydano 148 postanowień (uzgodnień) decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydano 116 decyzji na lokalizacje urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi,
- przeprowadzono 10 postępowań z zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 130 000,00 zł netto,
- Przeprowadzono 17 postępowań z zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto,
- zawarto 57 umów z wykonawcami robót,
- uzgodniono 9 przejazdów pojazdów nienormatywnych,
- przygotowano 52 wnioski do gmin na wycinkę drzew wraz z opracowanymi planami nowych nasadzeń,
- sporządzono 14 umów na wycinkę drzew,



Zakup kosiarki bijakowej ROLMEX KB 180 – koszt 47.189,00 zł



Zakup głowicy czyszczącej GC090V – koszt 18.200,00 zł



Inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku (w tym zadania realizowane w ramach RFRD)




Inwestycje 2025


lp	Nazwa	Ogółem	RFRD	Uwagi
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P(ul.Jarocińska)w m. Dobrzyca	2 118 977,81	1 259 086,68	Zadanie z 2024 r.- kontynuacja
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca	12 688 608,14	10 891 676,08	Zadanie z 2024 r.- kontynuacja
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie remontu przepustu	502 925,81		Zadanie z 2024 r.- kontynuacja
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie -Janków	75 000,00		Opracowanie dokumentacji
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko	50 000,00		Opracowanie dokumentacji
6	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	300 000,00		
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P Suchorzew-Kowalew	75 000,00		Opracowanie dokumentacji
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P Dobra Nadzieja etap II	60 000,00		Opracowanie dokumentacji
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	50 000,00		Opracowanie dokumentacji
	RAZEM	15 920 511,76		

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2024/2025



- 
- Sieć dróg i ulic powiatowych dla celów zimowego utrzymania została podzielona na 12 zadań, które zostały powierzone do wykonania 6 różnym firmom, wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Są to:
 - Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie,
 - Zakład Komunalny w Gizątkach,
 - Grupa Rolbud Sp. z o.o. Lubomierz,
 - PHU „Szymwał” S. Walczak z Taczanowa
 - „Gregbud” G. Rybarczyk z Nowego OleścaFirmy te dysponują niezbędnym sprzętem mechanicznym: samochodami ciężarowymi oraz ciągnikami z pługami odśnieżnymi i piaskarkami.
 - Umowy z wykonawcami zostały podpisane ZDP w dniu 18.11.2024 r.
 - Zimowym utrzymaniem zostały objęte drogi powiatowe o łącznej długości **358** kilometrów oraz chodniki o powierzchni **25 tys.m²**. Na poszczególnych drogach i ulicach wprowadzone zostały **II, III, IV i V** standard zimowego utrzymania.

- Ulice i chodniki w Pleszewie (o łącznej długości 11 km) będą w utrzymywane **II standardzie**, co oznacza odśnieżanie i posypywanie piaskiem na całej szerokości i długości (100%). Tak samo służby będą dbały o deptak do Marszewa, deptak Dobrzyca - Nowy Świat, chodnik do Kowalewa przy ul. Koźmińskiej, chodnik w Taczanowie II, kładkę w Fabianowie, chodnik w Marszewie, chodnik w Karminie. Do usuwania śliskości będzie używany m.in. piasek, kruszywo oraz mieszanina piasku z solą.
- **Standard III** polega na odśnieżaniu drogi na całej szerokości i całej długości (100%) oraz posypywaniu selektywnym w ważniejszych miejscach, jak skrzyżowania, przejazdy kolejowe, przystanki czy podjazdy, pochylenia podłużne, łuki i zakręty (25% - 100% długości). III standard będzie obowiązywał na powiatowych drogach wylotowych z Pleszewa, m.in. na: ul. Marszewskiej, drodze Pleszew - Grab, ul. Prokopowskiej, drodze Pleszew - Chocz, drodze Pleszew - Dobrzyca i do granicy z powiatem krotoszyńskim. W przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych koordynator może polecić zwalczanie śliskości na drogach w standardzie III również na całej długości. Ogółem długość dróg przewidzianych do utrzymania w tym standardzie to 42 km.
- Pozostałe drogi powiatowe znajdują się w **IV lub V standardzie**. **IV standard** oznacza odśnieżanie na całej długości i posypywanie nawierzchni w ważniejszych punktach co stanowi ok. 25% całej długości, a **V standard** - jedynie odśnieżanie. Ogółem długość dróg utrzymywanych w standardzie IV – 281 km a w standardzie V (drogi gruntowe) – 24 km



Po rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania przez koordynatora, wykonawca robót odpowiedzialny za zimowe utrzymanie podejmuje czynności odśnieżania lub zwalczania śliskości zgodnie z warunkami terenowymi (na podstawie prognoz meteorologicznych) bez oczekiwania na dyspozycję koordynatora. Jak co roku ustalono, że prawidłowość i jakość wykonywanych prac na poszczególnych odcinkach drogowych będą potwierdzali sołtysi. Stan dróg w mieście a także wyrwykowe kontrole na terenie na drogach i ulicach na terenie całego powiatu, prowadzone będą przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024-2025 Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie wg zawartych umów z wykonawcami musi zabezpieczyć środki w wysokości 962 570 zł. (więcej o 90000 zł niż w roku poprzednim). Są to środki wystarczające na 10 dni odśnieżania i 20 dni usuwania gołoledzi

Prowadzenie akcji zimowego utrzymania rozpoczyna Koordynator. Następnie wykonawca robót odpowiedzialny za zimowe utrzymanie podejmuje czynności odśnieżania lub zwalczania śliskości zgodnie z warunkami terenowymi (na podstawie prognoz meteorologicznych) bez oczekiwania na dyspozycję koordynatora



Dziękuję za uwagę

Piotr Fabisz
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie

Zdjęcia;

Tomasz Wojtala,

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

Piotr Fehler – Pleszew Nasze Miasto

Farida Leśniewska – Życie Pleszewa

Google Street View
